



# Redegørelse om Anlægs- og Renoveringsfonden 2022



## Indhold

Sammenfatning .....	1
1. Formålet med Anlægs- og Renoveringsfonden .....	2
2. Opgørelse af Anlægs- og Renoveringsfonden .....	3
2.1. Bevægelser i 2022.....	3
2.2. Udvikling de sidste 10 år.....	4
2.3. Projektstatus.....	5
3. Projekter i Anlægs- og Renoveringsfonden .....	6
3.1. Fordeling af projekter på hovedkonti.....	6
4. Økonomien for udvalgte projekter.....	8
4.1. Nye projekter i 2022 .....	8
4.2. Åbne projekter over 50 mio. kr. ....	9
4.3. Status for de 25 største projekter .....	10
Bilag .....	12
Bilag 1: Fordeling af projekter på hovedkonti .....	12
Bilag 2: Projektstatus .....	19
Bilag 3: Lovgrundlag for Anlægs- og Renoveringsfonden.....	26

## Sammenfatning

Denne redegørelse for finanslovsåret 2022 er nr. 23 i rækken af redegørelser om bevægelserne i Anlægs- og Renoveringsfonden.

Primo 2022 var Anlægs- og Renoveringsfondens beholdning på 1.028 mio. kr.

I 2022 blev der til projekter i Anlægs- og Renoveringsfonden bevilget 540 mio. kr. og forbrugt 620 mio. kr. Herudover blev fonden reduceret med 291 mio. kr. i bevillinger og 293 mio. kr. i forbindelse med lukning af projekter. Der er sendt afsluttede projekter til intern revision på 9 mio. kr. i bevilling og mindreforbrug på 2 mio. Det betyder, at der på projekterne i fonden netto er registreret 240 mio. kr. i bevillinger og 329 mio. kr. i forbrug i 2022.

Ultimo 2022 var Anlægs- og Renoveringsfondens beholdning på 940 mio. kr., hvilket reducerede Anlægs- og Renoveringsfonden med 89 mio. kr. fra primo 2022. Disse tal er eksklusivt udlån på nedenstående hovedkonti, og kan derfor ikke afstemmes med Landskassens regnskab.

- 20.30.07 Boligstøtte, renter og afdrag, netto
- 87.72.17 Boligstøtte, selvbyggerhuse
- 87.72.23 Boligstøtte, istandsættelsestilskud
- 89.72.11 Støttet privat boligbyggeri

Se tabel 2.1 for en opgørelse der kan afstemmes med Landskassens regnskab.

## 1. Formålet med Anlægs- og Renoveringsfonden

Formålet med oprettelsen af Anlægs- og Renoveringsfonden var at gøre procedurerne omkring bevilling af midler til anlægsopgaver mere smidige.

Selvstyret afsætter hvert år et beløb til anlægs- og renoveringsopgaver i Finansloven, den såkaldte anlægsramme. Anlægsrammen er sektorfordelt, hvor der inden for hver sektor foretages prioritering af konkrete anlægsopgaver.

Departementet for Boliger og Infrastruktur varetager Selvstyrets centrale bygherrefunktion.

Den centrale bygherrefunktion er opdelt i to operative enheder, så den overordnede planlægning og prioritering af opgaverne, budget- og økonomistyring samt bygherreadministrationen af nybyggeri varetages af Departementet for Boliger og Infrastruktur, mens renoverings-, vedligeholdelses- og nedrivningsopgaver varetages fra den til formålet oprettet underliggende Renoveringsstyrelse.

Anlægs- og Renoveringsfonden er en budgetteknisk fond<sup>1</sup>, der ikke kan søges midler fra. De midler, der er registreret i fonden, sker ved vedtagelse af den årlige Finanslov, og disse er bundet til konkrete projekter. Skal der rokeres midler fra fonden, skal dette ske ved at aflyse eller ændre et givent projekt, hvilket kræver politisk godkendelse af Inatsisartut eller Inatsisartuts Finans – og Skatteudvalg.

---

<sup>1</sup> Se bilag 3 Inatsisartutlov nr. 26 af 28. november 2016 om kommunernes og Grønlands Selvstyres budgetter og regnskaber, kapitel 4 om finanslovs, årsbudget mv., §14-17 om anlæg, renovering mv.

## 2. Opgørelse af Anlægs- og Renoveringsfonden

### 2.1. Bevægelser i 2022

Tallene i denne redegørelse er baseret på udtræk fra Selvstyrets økonomisystemer og er identiske med de tal der registreres i landskassens regnskab. Tabel 2.1 viser opgørelsen for Anlægs- og Renoveringsfonden i 2022 hvor "I alt" kan afstemmes direkte med landskassens regnskab.

Tabel 2.1 - Opgørelse af A&R fonden 2022 (i 1.000 kr.)

Beskrivelse	Primo 2022	Bevilling 2022	Forbrug 2022	Ændring 2022	Ultimo 2022
Lukkede projekter	1.976	290.732	-292.709	-1.977	0
Projekter til intern revision	-2.295	8.891	2.105	10.996	-8.701
Igangværende projekter	-1.028.222	-540.009	619.744	79.735	948.487
<b>Total for redegørelsen</b>	<b>-1.028.540</b>	<b>-240.386</b>	<b>329.141</b>	<b>88.755</b>	<b>939.785</b>
Midlertidige poster	11.536	0	-2.224	-2.224	9.312
<b>Subtotal</b>	<b>-1.017.004</b>	<b>-240.386</b>	<b>326.917</b>	<b>86.531</b>	<b>949.097</b>
Hovedkonto 20.30.07	-9.027	0	0	0	-9.027
Hovedkonto 87.72.17	-7	0	0	0	-7
Hovedkonto 87.72.23	-10.851	0	0	0	-10.851
Hovedkonto 89.72.11	37.117	-24.225	450	-23.776	13.341
<b>I alt</b>	<b>-999.773</b>	<b>-264.611</b>	<b>327.367</b>	<b>62.755</b>	<b>-937.018</b>

Redegørelsen for Anlægs- og Renoveringsfonden dækker fra 2010 ikke hovedkonto 89.72.11 Støttet privat boligbyggeri. Fra 2016 dækker redegørelsen heller ikke hovedkonto 20.30.07 Boligstøtte, renter og afdrag, netto. Fra 2019 dækker redegørelsen desuden ikke 87.72.17 Boligstøtte, selvbyggerhuse og 87.72.23 Boligstøtte, istandsættelsestilskud.

Disse konti er derfor kun medtaget for at opgørelsen for Anlægs- & Renoveringsfonden kan afstemmes med landskassens regnskab.

De midlertidige poster dækker over poster, som ikke er registeret korrekt. Posterne vedrører primært Pisariillisaaneq-projektet, ERP og vil blive bogført på plads i 2023.

I 2022 blev der til projekter i Anlægs- og Renoveringsfonden bevilget 540 mio. kr. og forbrugt 620 mio. kr. Herudover blev fonden reduceret med 291 mio. kr. i bevillinger og 293 mio. kr. i forbindelse med lukning af projekter. Der er sent projekter til intern revision på 9 mio. kr. i bevilling og mindreforbrug på 2 mio. Det betyder, at der på projekterne i fonden netto er registreret 240 mio. kr. i bevillinger og 329 mio. kr. i forbrug i 2022.


Primo 2022 var A&R fondens beholdning på 1.029 mio. kr., eksklusiv de fire hovedkonti nævnt ovenfor.

Ultimo 2022 var A&R fondens beholdning dermed 940 mio. kr., hvilket var en reduktion af Anlægs- og Renoveringsfonden med 89 mio. kr.


## 2.2. Udvikling de sidste 10 år

Bevillingerne i 2022 udgjorde 265 mio. kr., mens forbruget udgjorde 327 mio. kr. Det har medført en reduktion af Anlægs- og Renoveringsfonden inklusiv låneområdet på 63 mio. kr.

Den historiske udvikling kan aflæses af de nedenstående figurer.

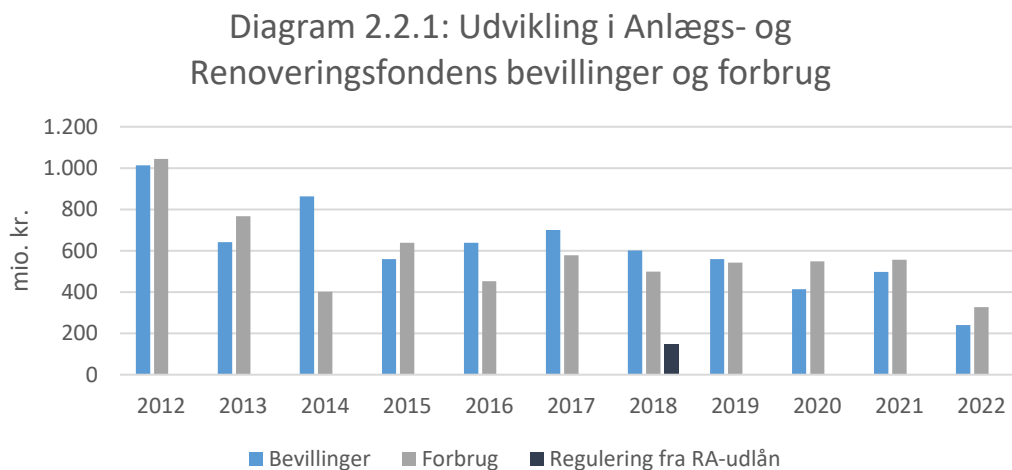

Kilde: Selvstyrets økonomisystem

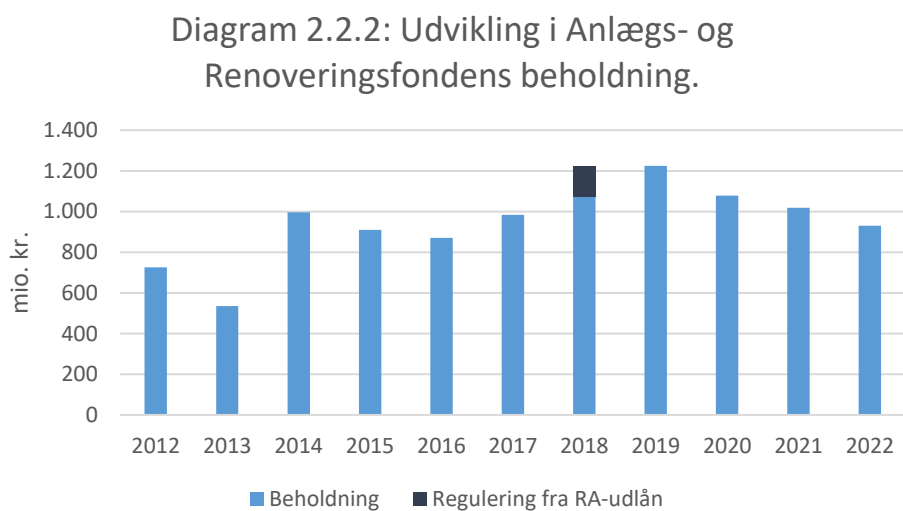

Kilde: Selvstyrets økonomisystem

### 2.3. Projektstatus

I 2022 var der oprettet 21 nye projekter, 110 projekter er videreført fra tidligere år, og 24 projekter blev lukket. Herudover var der 56 i lukningsproces hos Intern Revision.

Projekternes status beskrevet i tabel 2.3 herunder. Se yderligere detaljer i bilag 2.

Tabel 2.3: Projektstatus

Projektstatus	Antal projekter
Igangværende	131
<i>heraf nye</i>	21
Til intern revision	56
<b>Åbne projekter</b>	<b>187</b>
Lukket	24
<b>Projekter i alt</b>	<b>211</b>

### 3. Projekter i Anlægs- og Renoveringsfonden

#### 3.1. Fordeling af projekter på hovedkonti

De fem største hovedkonti (målt i disponible midler) var 89.72.12 "Boligprojekter og erstatningsbyggeri", 86.60.01 "Sundhedsvæsenet", 84.40.15 "Kollegiebyggeri", 87.73.12 "Reinvestering i havne og kajanlæg" og 83.30.13 "Landsdækkende institutioner". Se yderligere detaljer i bilag 1.

Table 3.1: Fordeling af projekter på hovedkonti (i 1.000 kr.).

Hovedkonto	Nye projekter	Projekter total	Primo	Bevilling	Disponibel	Forbrug	Ultimo	Forbrug i %	Rest desponering
011014 Reserve til ny Landstingssal		2	1.413		1.413		1.413		1.047
011015 Anlæg og vedligehold under Inatsisartut		1	1.936		1.936		1.936		1.704
800001 Omroeringsreserven		1	9.800	54.827	64.627		64.627		64.627
800010 Tilbageførslser fra Anlægs- og renoveringsfonden		1	2.513		2.513		2.513		0
811002 Renovering og ombygning Selvstyrets centrale administration		1	1.300		1.300		1.300		1.300
822002 Pisariillisaaneq-projektet, ERP		2	-2.850	2.000	-850	9.372	8.522	-1103 %	23.130
822003 IT-systemer til socialområdet		1	11.000		11.000	-11.722	-722	-107 %	-1.041
822401 Administrative systemer mv. i Skattestyrelsen		2	1.929	9.300	11.229	-3.380	7.849	-30 %	-281
833012 Ældreinstitutioner	1	9	34.742	12.200	46.942	-3.640	43.302	-8 %	-11.555
833013 Landsdækkende institutioner	1	16	88.561	620	89.181	-18.441	70.740	-21 %	23.919
833014 Hjemløseindsatser	1	1		3.900	3.900		3.900		3.900
844009 Erhvervsuddannelsesområdet		1	-209	208	-1		-1		0
844010 Kommunale skoler		8	-3.645	-20.571	-24.216	18.086	-6.130	-75 %	-167.129
844012 Uddannelsesbyggeri	2	12	8.828	40.293	49.121	-30.639	18.482	-62 %	27.212
844014 Kultur- og idrætsbyggeri		1	5.596	3.500	9.096	-917	8.178	-10 %	7.457
844015 Kollegiebyggeri		11	216.179	57.876	274.055	-165.427	108.628	-60 %	-112.202
844016 Kulturbyggeri		1	-250	250	0		0		-4.232
844017 Institutioner for børn og unge		1	9	-2.400	-2.391	2.391	0	-100 %	-2.402
844018 Øvrige skolebygninger		1	47	-475	-428	428	0	-100 %	-432
844501 Kirken		2	103	-103	0		0		-90
855020 Turismeanlæg		4	15.400	-15.000	400	14.598	14.998	3650 %	-783
859001 Nye kontrolfartøjer til Grønlands Fiskerilicenskontrol		1		6.500	6.500	637	7.137	10 %	3.911
866001 Sundhedsvæsenet	2	24	198.734	-8.930	189.804	-16.397	173.407	-9 %	-173.193
870088 Anlægsstrategi for bygder og yderdistrikter		2	6.319	-1.821	4.498		4.498		-7.091
871106 5-års eftersyn		3	808	-8	800	-135	665	-17 %	-736
871109 Transportkommissionen - forundersøgelser		1	30.906	-11.418	19.488	-3.497	15.992	-18 %	13.892
877210 Personaleboliger i Nuuk		1	13.131	3.500	16.631	-838	15.793	-5 %	13.347
877213 Særlig renovering		1	80	7.000	7.080	-311	6.769	-4 %	-25.070
877221 Støttet kommunalt udlejningsbyggeri		2	-1.556	-19.810	-21.366	21.366	0	-100 %	-102.452



877222 Boligprogram for bygder og yderdistrikter		4	2.639	879	3.518	-6.254	-2.737	-178 %	-40.664	
877310 Havneanlæg		2	4.780	-4.779	1		1		-4.716	
877312 Reinvestering i havne og kaj anlæg	3	10	53.205	51.635	104.840	-20.866	83.974	-20 %	71.867	
877320 Udbygning af landingsbanestruktur	2	6	1.310	1.517	2.827	-5	2.823	-0 %	2.781	
877322 GLV - landingspladser		12	36.016	1.123	37.139	-20.866	16.274	-56 %	-63.233	
877501 Nyt skib til Pinngortitaleriffik		1	-2.240		-2.240		-2.240		-2.256	
877503 Tilskud til kommunale miljøanlæg		1	2.439		2.439		2.439		95	
877504 Asiaq	1	1		1.700	1.700	-100	1.600	-6 %	1.700	
897140 Nukissiorfiit, anlægsudlån	1	3	0	-60.000	-60.000	60.000	0	-100 %	-163.900	
897212 Boligprojekter og Erstatningsbyggeri	7	57	289.567	126.873	416.440	-152.583	263.856	-37 %	-505.781	
<b>Total</b>		<b>21</b>	<b>211</b>	<b>1.028.540</b>	<b>240.386</b>	<b>1.268.926</b>	<b>-329.141</b>	<b>939.785</b>	<b>-26 %</b>	<b>-1.127.350</b>

## 4. Økonomien for udvalgte projekter

### 4.1. Nye projekter i 2022

Der blev oprettet 21 nye projekter i 2022. Projekternes bevillinger udgjorde i alt 141 mio. kr., svarende til ca. 26 % af de samlede anlægsbevillinger på igangværende projekter i 2022. Se yderligere detaljer i bilag 2.

Tabel 4.1: Nye projekter i 2022 (i 1.000 kr.)

Finanslov	Hovedprojekt id & Navn	Bevilling	Forbrug
833012	44057 Alderdomshjem, Ilulissat	2.000	
833013	40092 Aktivitetshus til børn og unge, Kullorsuaq	9.000	
833014	40093 Forsøgsordning for hjemløse i Nuuk	3.900	
844012	52118 Diverse reovering	31.200	-30.190
844012	52119 Tilstandsregistrering af uddannelsesbygninger	8.000	-177
866001	46035 Allorfik, misbrugsbehandlingscenter Nuuk	6.000	-5.786
866001	46037 Tilskud til Neriuffik	1.500	
877312	24138 Havnefaciliteter i Aasiaat	2.500	
877312	24139 Havnefaciliteter i Maniitsoq	3.000	
877312	24140 Havnefaciliteter i Kullorsuaq	600	
877320	25216 Tasiilaq, landingsbane	1.400	-13
877320	25217 Ittoqqortoormiit, landingsbane	600	-13
877504	32148 Tilbygning til ASIAQ, Nuuk	1.700	-100
897140	17779 Udlån til Nukissiorfiit, 2022	60.000	-60.000
897212	31062 Skimmel reovering, Aasiaat	1.500	-39
897212	32142 Ungdomsboliger, Tasiilaq	1.333	-756
897212	32143 Ungdomsboliger, Upernavik	1.333	-718
897212	32144 Ungdomsboliger, Qasigiannuguit	1.333	-633
897212	32145 Ungdomsboliger, Uummannaq	1.333	-494
897212	32146 Ungdomsboliger, Kangaatsiaq	1.334	-649
897212	32147 Ungdomsboliger, Ittoqqortoormiit	1.334	-470
<b>Total</b>		<b>140.900</b>	<b>-100.039</b>

## 4.2. Åbne projekter over 50 mio. kr.

Der var 21 åbne projekter med en total bevilling på over 50 mio. kr. i 2022. Se yderligere detaljer i bilag 1 og 2.

Tabel 4.2: Åbne projekter over 50 mio. kr. (i 1.000 kr.).

Hovedprojekt id & Navn	Finanslov	Bevilling t.o.m indeværende finansår	Forbrug t.o.m. i år
17779 Udlån til Nukissiorfiit, 2022	897140	60.000	-60.000
23004 Transportkommissionen - forundersøgelser	871109	65.735	-49.743
24116 Reinvestering i havne og kaj anlæg	877312	195.069	-171.273
25183 Langsigtede investeringsbehov	877322	50.000	-40.830
30017 Bæredygtige boliger 2016, Sisimiut	897212	79.710	-77.054
30019 Funktionelle boliger, Ilulissat	897212	62.200	-55.392
31037 Skimmel reovering	897212	60.700	-55.535
31048 Renovering af altangange og altaner, Nuuk	897212	82.400	-80.758
34527 Diverse reovering og sanering	897212	388.355	-256.458
39041 Genhusning efter oversvømmelse	897212	81.554	-110.982
40077 Handicapinstitution Sungiusarfik Ikinngut	833013	65.020	-56.635
47042 Regionssygehus i Sisimiut	866001	114.178	-29.221
47051 Apparaturløjen	866001	121.000	-88.612
47053 Vedligeholdelseefterslæb	866001	135.400	-119.228
52112 70 sengepladser, Ilulissat	844015	53.600	-31.933
52113 72 sengepladser, Sisimiut	844015	74.350	-37.740
52114 219 sengepladser, Nuuk	844015	146.500	-135.288
52115 74 sengepladser, Qaqortoq	844015	64.850	-55.341
61003 Nyt skib til Pinnortitaleriffik	877501	220.000	-222.240
90022 Pisariillisaaneq-projektet, ERP	822002	75.942	-70.420
<b>Total</b>		<b>2.261.190</b>	<b>-1.804.681</b>

### 4.3. Status for de 25 største projekter

Nedenfor fremgår status for de 25 største projekter målt på den totale bevilling ultimo 2022. Her er der tale om projekter, som endnu ikke er sendt til intern revision.

Hovedprojekt id & Navn	Finans- lov	Bevilling t.o.m indeværende finansår	Forbrug t.o.m. i år	Status
17779 Udlån til Nukissiorfiit, 2022	897140	60.000	-60.000	Anlægslån til Nukissiorfiit udbetales efter anmodning fra virksomheden.
23004 Transportkommissionen - forundersøgelser	871109	65.735	-49.743	Projektet er en puljebevilling til gennemførelse af mange mindre opgaver – herunder særligt rådgivningsopgaver i forbindelse med udbygning af landets infrastruktur.
24116 Reinvestering i havne og kaj anlæg	877312	195.069	-171.273	Projektet er en puljebevilling til gennemførelse af mange mindre opgaver – opgaver i henhold til sektorplanerne udbydes løbende, hvor der tages højde for øvrige opgaver hvert sted, og behov for beskæftigelse
24128 Diverse nyanlæg	877312	40.922	-204	Projektet er en puljebevilling til gennemførelse af mange mindre opgaver – opgaver i henhold til sektorplanerne udbydes løbende, hvor der tages højde for øvrige opgaver hvert sted, og behov for beskæftigelse. Midlerne i puljen er desuden tiltænkt til udmøntning for ny anlæg i Asiaat og Maniitsoq.
25183 Langsigtede investeringsbehov	877322	50.000	-40.830	Projektet er en puljebevilling til gennemførelse af opgaver – herunder særligt akutte opgaver som følge af hidtil manglende investering i landets lufthavne – baner/asfalt, bygninger, rullende materiel.
30017 Bæredygtige boliger 2016, Sisimiut	897212	79.710	-77.054	Opgaven er udført, hvor der under 1 års eftersynsperiode er konstateret mangler – mangeludbedring pågår.
30019 Funktionelle boliger, Ilulissat	897212	62.200	-55.392	Overdragelse er planlagt til at blive udført den 8. marts. I den forbindelse skal der udarbejdes pressemeddelelse. (Blok 6-7-8 bliver delafleveret den 1. marts)
30026 Nye boliger 2019, Asiaat	897212	41.900	-24.880	60 boliger, 20 Selvstyret + 40 Kommunen Byggeriet kører fint, men lidt forsinket.
31037 Skimmel renovering	897212	60.700	-55.535	Projektet er en puljebevilling til gennemførelse af 'smilende boliger' konceptet (totalrenovering) i Selvstyrets boliger der står i tomgang pga. skimmel. Opgaverne udbydes løbende i underhåndbud, for at imødekomme behov for beskæftigelse i branchen. Der er udbudt færre opgaver i 2021 end forventet, pga. mangel på kapacitet. Tillige kan der afholdes over bevillingen tilskud til INI A/S for udbedring af mindre skimmelsopgaver.
31048 Renovering af altangange og altaner, Nuuk	897212	82.400	-80.758	Opgaven er udført, hvor der under 1 års eftersynsperiode er konstateret mangler – mangeludbedring pågår. Projektet afsluttes og lukkes i 2023.
31066 Fornyelse af installationer i flere byer	897212	45.200	-32.038	Udførelse har haft en del opstartsudfordringer, herunder bl.a. manglende kapacitet pga. coronasmitte, strømsvigt, skader på rør, som er løst løbende. Fortsætter i Nuuk og Sisimiut + uddannelse samt udførelse i øvrige byer i 2023.
34527 Diverse renovering og sanering	897212	388.355	-256.458	Projektet er en puljebevilling til gennemførelse af mange mindre opgaver – opgaver i henhold til sektorplanerne udbydes løbende, hvor der tages højde for øvrige opgaver hvert sted, og behov for beskæftigelse.
39041 Genhusning efter oversvømmelse	897212	81.554	-110.982	Opgaven er udført, og 1 års eftersynsperiode + mangeludbedring heraf er gennemført i efteråret 2021. Udarbejdelse og afklaring af byggeregnskab pågår, afsluttes og lukkes i 2023. Forinden lukning, skal der gennemføres rokering af midler der er modtaget fra Staten ifb. med tsunamien. Projektets bevilling vil herefter stemme med forbruget.
40077 Handicapinstitution Sungiusarfik Ikinngut	833013	65.020	-56.635	Udført - lukkes i 2023
47042 Regionssygehus i Sisimiut	866001	114.178	-29.221	Byggeriet kører iht. tidsplan – støbning af fundament pågår
47051 Apparatpøljen	866001	121.000	-88.612	Projektet er en puljebevilling til indkøb af apparatur til sundhedsvæsenet. Herunder indkøb for såvel fornyelse, udvidelse, reparation og vedligehold.

47053 Vedligeholdelseftegerslæ b	866001	135.400	-119.228	Projektet er en puljebevilling til gennemførelse af mange mindre opgaver – opgaver i henhold til sektorplanerne udbydes løbende, hvor der tages højde for øvrige opgaver hvert sted, og behov for beskæftigelse.
52095 Skolepraktikhaller og haller til ko	844012	36.500	-35.773	Udført - lukkes i 2023.
52111 32 sengepladser, Aasiaat	844015	49.800	-27.617	Opførelse af kollegier i Aasiaat er opstartet i 2021, følger tidsplanen og forventes afleveret i henhold til kontraktens afleveringsterminen.
52112 70 sengepladser, Ilulissat	844015	53.600	-31.933	Opførelse af kollegier i Ilulissat er opstartet i 2021, følger tidsplanen og forventes afleveret i henhold til kontraktens afleveringsterminen.
52113 72 sengepladser, Sisimiut	844015	74.350	-37.740	Opførelse af kollegier i Sisimiut er opstartet i 2021, følger tidsplanen og forventes afleveret i henhold til kontraktens afleveringsterminen.
52114 219 sengepladser, Nuuk	844015	146.500	-135.288	Opførelse af kollegier i Nuuk er opstartet i 2021, følger tidsplanen og forventes afleveret i henhold til kontraktens afleveringsterminen.
52115 74 sengepladser, Qaqortoq	844015	64.850	-55.341	Opførelse af kollegier i Qaqortoq er opstartet i 2021, følger tidsplanen og forventes afleveret i henhold til kontraktens afleveringsterminen.
61003 Nyt skib til Pinngortitaleriffik	877501	220.000	-222.240	Skibet er afleveret, hvor der mangler sidste opgørelse af fondsmidler. Lukkes i 2023.
90022 Pisariillisaaneq- projektet, ERP	822002	75.942	-70.420	Projektet er implementeret og i drift i Selvstyret og de 5 kommuner. De midlertidige poster i tabel 2.1 kan delvist henføres til dette projekt, hvorfor forbruget vil stige, når posterne er bogført på plads i 2023.
<b>Total</b>		<b>2.410.885</b>	<b>-1.925.192</b>	

# Bilag

## Bilag 1: Fordeling af projekter på hovedkonti

Finanslov	Hovedprojekt id & Navn	Primo	Bevilling	Disponibel	Forbrug	Ultimo	Total bevilling Ultimo	Total forbrug	Total disponeret	Total forbrug i % af total bevilling
011014	10019 Udvidelse af Landstingssal	-75		-75		-75	3.379	-3.454	-3.455	
011014	10053 Ny bygning til Inatsisatut	1.488		1.488		1.488	3.000	-1.512	-1.878	
011015	10049 22 mindre boliger til Inatsisartut	1.936		1.936		1.936	6.000	-4.064	-4.296	
800001	80800 Omrokeringsreserve	9.800	54.827	64.627		64.627	64.627			
800010	80801 Tilbageførslers fra Anlægs- og renoveringsfonden	2.513		2.513		2.513	0	2.513		
811002	10054 Selvstyrets Central Administration	1.300		1.300		1.300	1.300			
822002	90022 Pisariillisaaneq-projektet, ERP	-3.850		-3.850	9.372	5.522	75.942	-70.420	-55.812	-243 %
822002	90028 Udvikling af ERP	1.000	2.000	3.000		3.000	3.000			
822003	40089 Fælles kommunalt ESDH-system til socialområdet	11.000		11.000	-11.722	-722	11.000	-11.722	-12.041	-107 %
822401	90024 Administrative systemer mv. i Skattestyrelse	3.313	3.000	6.313	-3.380	2.933	8.400	-5.467	-13.597	-54 %
822401	90025 Beskæftigelsesfradrag	-1.384	6.300	4.916		4.916	6.300	-1.384	-1.384	
833012	44044 Renovering og tilbygn. alderdomshjem, Nanortalik	1.742		1.742		1.742	13.575	-11.833	-13.581	
833012	44047 Alderdomshjem i Paamiut	2.231		2.231		2.231	27.500	-25.269	-27.506	
833012	44048 Pulje til nyanlæg og renovering	7.700	13.800	21.500		21.500	21.500			
833012	44049 Tilstandsregistrering af ældreområdet	-62	-3.600	-3.662	3.662	0	0	0	-3.662	-100 %
833012	44051 Renovering/nybygning alderdomshjem, Narsaq	6.520		6.520	-3.623	2.897	16.350	-13.453	-23.663	-56 %
833012	44053 Udvidelse af alderdomshjem, Upernavik	13.204		13.204	-3.679	9.525	18.000	-8.475	-18.028	-28 %
833012	44054 Udvidelse af alderdomshjem, Aasiaat	3.867		3.867		3.867	16.400	-12.533	-16.406	
833012	44056 Demensafsnit på aldersomshjem, Sisimiut	-460		-460		-460		-460	-460	
833012	44057 Alderdomshjem, Ilulissat		2.000	2.000		2.000	2.000		-2.000	
833013	40054 Landsdækkende handicap træningscenter	1.236	-1.236	0		0	55.033	-55.033	-58.138	
833013	40058 Handicapinstitution Elisibannuaq, Maniitsoq	141	-141	0		0	7.459	-7.459	-7.412	
833013	40062 Udredningshjem	6.129	-6.129	0		0	8.271	-8.271	-8.789	
833013	40063 Misbrugsbehandlingshjem	2	-20	-18	18	0	0	0	-18	-100 %
833013	40064 Hus til ungdomsafdeling i Inn. Inaat	-62		-62		-62	3.300	-3.362	-3.392	
833013	40066 Opdeling af Aaqa i to institutioner	1.979		1.979	-823	1.156	2.000	-1.122	-2.511	-42 %

833013	40067 Pulje til nyanlæg og reovering	22.467		22.467	-38	22.429	22.520	-91	-91	0 %
833013	40068 Oprettelse af familie/krisecenter, Tasiilaq	276	-276	0		0	2.224	-2.224	-2.225	
833013	40075 Lukket gårdmiljø til Isikkivik	818	-818	0		0	12	-12	-822	
833013	40077 Handicapinstitution Sungiusarfik Ikinngut	12.536		12.536	-4.151	8.385	65.020	-58.095	-60.255	-33 %
833013	40081 Satellitafdeling til Meeqqat Illuat, Nuuk	-11	-40	-51	51	0	0	0	-51	-100 %
833013	40084 Genopførelse af udsusninghjem, Uummanaq	5.035	280	5.315	-5.315	0	5.595	-5.595	-6.358	-100 %
833013	40086 Døgninstitution for børn med sindslidelser	5.431		5.431	-178	5.253	6.000	-747	-838	-3 %
833013	40090 Etablering af satellitafdeling til Pilutaq	1.691		1.691	-1.442	249	7.000	-6.751	-6.907	-85 %
833013	40091 Najugaqarfik Elisibannguaq-nybyg og reovering	30.891		30.891	-6.563	24.328	34.500	-11.076	-28.681	-21 %
833013	40092 Aktivitetshus til børn og unge, Kullorsuaq		9.000	9.000		9.000	9.000			
833014	40093 Forsøgsordning for hjemløse i Nuuk		3.900	3.900		3.900	3.900			
844009	51013 Udvidelse INULLI, Narsaq	-209	208	-1		-1	61.608	-61.609	-61.609	
844010	50069 Ren/ombyggn.udv. skole Qaqortoq	936	-935	1		1	114.765	-114.764	-114.764	
844010	50091 Skolen Aappilattoq	64	-18.150	-18.086	18.086	0	0	0	-17.637	-100 %
844010	50111 Ren./ombyggn./udv. skole, Sarfanguit	514	-514	0		0	8.986	-8.986	-9.517	
844010	50115 Ren./ombyggn./udv. skole, Nuussuaq	772	-771	1		1	9.029	-9.028	-9.031	
844010	50126 Udv./ren./ombyg. af skole, Upv. Kujalleq	2.631		2.631		2.631	13.700	-11.069	-11.333	
844010	50131 Ny skole i Ilulissat	201	-201	0		0	192.454	-192.454	-195.481	
844010	50132 Diverse skole, nyanlæg og reovering	-7.254		-7.254		-7.254	-1.050	-6.204	-6.179	
844010	50133 Bygdeskole, Alluitsup Paa	-1.510		-1.510		-1.510	27.850	-29.360	-29.818	
844012	51021 Projektplan for udflytning af udd. inst.	-330	329	-1		-1	2.829	-2.830	-3.076	
844012	51024 Uddannelsesbyggeri til projektering af ny Jern- og Metalskol	9.431		9.431		9.431	10.000	-569	-953	
844012	51026 Landbrugsskole i Upernaviarsuk	2.873		2.873	-131	2.743	3.000	-257	-544	-5 %
844012	52061 Udvidelse af GU, Aasiaat	-182	182	0		0	89.582	-89.582	-89.582	
844012	52085 Renov. af udd. bygnigner Qeq. kommunia	-62	-309	-371	371	0	0	0	-330	-100 %
844012	52086 Udvidelse af PISPS, Ilulissat	-814	813	-1		-1	45.157	-45.158	-45.156	
844012	52087 Erstaningsbyggeri for NI+GU, Qaoqrotq	471	-471	0		0	103.929	-103.929	-104.680	
844012	52088 Erstatningsbyggeri for Ledelsesakademi, Nuuk	-550	549	-1		-1	13.049	-13.050	-13.050	
844012	52094 Renovering af Knud Rasmussenip Højskolia	-2.958		-2.958	-291	-3.249	19.691	-22.952	-22.871	10 %
844012	52095 Skolepraktikhaller og haller til ko	948		948	-220	727	36.500	-35.773	-36.389	-23 %
844012	52118 Diverse reovering		31.200	31.200	-30.190	1.010	31.200	-30.198	-13.917	-97 %

844012	52119 Tilstandsregistrering af uddannelsesbygninger		8.000	8.000	-177	7.823	8.000	-177	-177	-2 %
844014	54007 Tilskud til renovering af idrætshaller	5.596	3.500	9.096	-917	8.178	21.400	-13.222	-13.942	-10 %
844015	52071 Skolehjem med 50 værelser , Uummanaq	-472	472	0		0	32.472	-32.472	-32.587	
844015	52092 Etablering/renovering elevhjem Qassiarsuk	5.245		5.245	-197	5.048	20.700	-15.788	-19.933	-4 %
844015	52101 Projektering af standardkollegier, 2015	-304	304	0		0	2.382	-2.382	-2.382	
844015	52102 Projektering af standardkollegier	3.118	4.100	7.218	-4.819	2.399	10.100	-8.211	-29.059	-67 %
844015	52103 Projektering af standardkollegier, 2017	13	-2.100	-2.087	2.087	0	0	0	-2.127	-100 %
844015	52104 Diverse kollegieprojekter	-10.560		-10.560	10.560	0	0	0	-10.560	-100 %
844015	52111 32 sengepladser, Aasiaat	31.399	8.000	39.399	-17.216	22.183	49.800	-31.641	-44.193	-44 %
844015	52112 70 sengepladser, Ilulissat	35.254	9.000	44.254	-22.587	21.667	53.600	-35.513	-46.688	-51 %
844015	52113 72 sengepladser, Sisimiut	49.622	10.100	59.722	-23.111	36.610	74.350	-38.727	-50.263	-39 %
844015	52114 219 sengepladser, Nuuk	91.340	15.000	106.340	-95.128	11.212	146.500	-148.907	-141.163	-89 %
844015	52115 74 sengepladser, Qaqortoq	11.525	13.000	24.525	-15.015	9.509	64.850	-56.446	-66.668	-61 %
844016	56003 Ny KNR	-250	250	0		0	12.370	-12.370	-12.402	
844017	41050 Daginstitution i Atammik, 2015	9	-2.400	-2.391	2.391	0	0	0	-2.400	-100 %
844018	50148 Køb af hus til Ado Lyngep Atuarfia	47	-475	-428	428	0	0	0	-432	-100 %
844501	58041 Renovering af kirke, Ittoqqortoormiit	476	-476	0		0	979	-979	-1.069	
844501	58046 Genopførelse, Kirken i Nuussuaq	-373	373	0		0	373	-373	-373	
855020	72003 Is-fjordscenteret, Ilulissat	0	-15.000	-15.000	15.000	0	0	0	-15.000	-100 %
855020	72004 Etablering af Visitorcentre	10.300		10.300	-402	9.898	10.300	-402	-1.183	-4 %
855020	72010 Nuuk Natur- og geopark	9.750		9.750		9.750	9.750			
855020	72011 Nationale seværdigheder	-4.650		-4.650		-4.650	-4.650			
859001	61004 Anskaffelse af Fartøjer til GFLK		6.500	6.500	637	7.137	6.500	-2.663	-2.589	10 %
866001	46009 Laboratorium/DIH, Nuuk	18		18	-18	0		0		-100 %
866001	46017 Patienthotel, Nuuk	-25	-66.522	-66.547	66.547	0	0	0	-66.547	-100 %
866001	46021 Psykiatrybygning i Nuuk	936	1.100	2.036	-1.184	852	24.100	-23.411	-24.533	-58 %
866001	46023 Energioptimering DIH, Nuuk	1.076		1.076	-36	1.039	7.000	-5.961	-5.961	-3 %
866001	46026 Allorfik, lokale misbrugsbehandlingscenter	44	-1.900	-1.856	1.856	0	0	0	-1.856	-100 %
866001	46027 Allorfik, misbrugsbehandlingscenter, Sisimiut	221	-221	0		0	2.279	-2.279	-2.279	
866001	46028 Patienthotel i Aasiaat	-1.046	1.045	-1		-1	17.956	-17.957	-17.640	
866001	46029 Allorfik, misbrugsbehandlingscenter, Aasiaat	55	-2.500	-2.445	2.445	0	0	0	-2.701	-100 %



866001	46030 Allorfik, misbrugsbehandlingscenter, Ilulissat	983	-982	1	1	2.018	-2.017	-2.017		
866001	46031 Projektering af ny sengeføj og patienthotel	2.944	5.000	7.944	-1.897	6.048	8.000	-2.114	-2.604	-24 %
866001	46032 Rømning af byggegrund	3.000		3.000		3.000	3.000			
866001	46033 Steno Diabetes Center	3.003		3.003	-13.583	-10.580		-15.624	-38.083	-452 %
866001	46034 Anskaffelser af ambulancer	4.552	2.500	7.052	-3.457	3.595	7.500	-3.905	-3.905	-49 %
866001	46035 Allorfik, misbrugsbehandlingscenter Nuuk		6.000	6.000	-5.786	215	6.000	-5.786	-5.786	-96 %
866001	46037 Tilskud til Neriuffik		1.500	1.500		1.500	1.500			
866001	47031 Udbygning DIH - fondsmidler	-136		-136		-136	53.428	-53.564	-193.660	
866001	47041 Ilt produktions anlæg i sygehuse	2.827		2.827		2.827	6.500	-3.673	-3.673	
866001	47042 Regionssygehus i Sisimiut	2.393	111.400	113.793	-28.835	84.957	113.800	-32.779	-43.783	-25 %
866001	47047 Børneafdeling på DIH, Nuuk	300	-300	0		0	200	-200	-203	
866001	47051 Apparaturpuljen	25.696	17.900	43.596	-11.208	32.388	121.000	-88.612	-88.635	-26 %
866001	47053 Vedligeholdelseefterslæb	13.599	28.400	41.999	-25.827	16.172	135.400	-119.228	-119.228	-61 %
866001	47055 Diverse nyanlæg og renovering	133.904	-108.800	25.104		25.104	25.250	-146	-149	
866001	47060 Nyt operationsafsnit, Sisimiut	-2.620	-2.550	-5.170	5.170	0	0	0	0	-100 %
866001	48013 Centralklinik i Nuuk	7.011		7.011	-585	6.426	9.218	-2.792	-3.993	-8 %
870088	29107 Vej i Sydgrønland	1.821	-1.821	0		0	28.004	-28.004	-28.093	
870088	29108 Vej mellem Sisimit og Kangerlussuaq	4.498		4.498		4.498	5.000	-502	-502	
871106	73014 5-års eftersyn, 2019	303	-303	0		0	197	-197	-372	
871106	73015 5-års eftersyn, 2020	206	-205	1		1	295	-294	-314	
871106	73016 5-års eftersyn	299	500	799	-135	664	1.000	-338	-443	-17 %
871109	23004 Transportkommissionen - forundersøgelser	30.906	-11.418	19.488	-3.497	15.992	65.735	-49.747	-51.843	-18 %
877210	30012 Personaleboliger i Nuuk	13.131	3.500	16.631	-838	15.793	25.500	-10.048	-12.153	-5 %
877213	97157 Bevaringsværdige bygninger i Nuuk	80	7.000	7.080	-311	6.769	18.000	-11.232	-11.844	-4 %
877221	32066 Støttet kom. udl.byggeri, 2006	0	-21.366	-21.366	21.366	0	0	0	-21.366	-100 %
877221	32090 Støttet kom. udl.byggeri, 2009	-1.556	1.556	0		0	71.356	-71.356	-71.356	
877222	35025 Boligprg.f/bygder og yderd. 2015	-708	708	0		0	9.108	-9.108	-9.108	
877222	35026 Boligprg.f/bygder og yderd. 2016	0	18	18	-6.254	-6.236	18	-6.254	-6.273	-34746 %
877222	36106 Udvikling og afprøvning af Illorput 2100	-153	153	0		0	2.633	-2.633	-2.633	
877222	39039 Aktivitetshus til Kullorsuaq	3.500		3.500		3.500	3.500		-3.500	
877310	24111 Ekstra renovering og istandsættelse 2014	2.737	-2.736	1		1	5.964	-5.963	-8.708	

877310	24112 Sektorplan for havne, 2015	2.043	-2.043	0	0	457	-457	-2.429		
877312	24116 Reinvestering i havne og kajanlæg	18.000	25.200	43.200	-19.404	23.796	195.069	-171.913	-180.920	-45 %
877312	24122 Sektorplaner for havne	3.600		3.600		3.600	3.700	-100	-104	
877312	24128 Diverse nyanlæg	21.318	19.400	40.718		40.718	40.922	-204	-236	
877312	24129 Havn i Kangerlussuaq	3.633		3.633		3.633	4.000	-367	-459	
877312	24130 Læmole i Qaanaaq	-935	935	0		0	33.935	-33.935	-33.813	
877312	24131 Havnefaciliteter i Uummannaq	4.443		4.443	-111	4.332	34.100	-29.786	-32.222	-3 %
877312	24136 Etablering af anløbsfaciliteter	3.145		3.145	-1.350	1.795	4.150	-2.355	-2.355	-43 %
877312	24138 Havnefaciliteter i Aasiaat		2.500	2.500		2.500	2.500			
877312	24139 Havnefaciliteter i Maniitsoq		3.000	3.000		3.000	3.000			
877312	24140 Havnefaciliteter i Kullorsuaq		600	600		600	600			
877320	25196 Qeqertarsuaq	483	-483	0		0	17	-17	-10	
877320	25200 Nanortalik	-15	0	-15	15	0	0	0	-9	-100 %
877320	25201 Kangerlussuaq	849		849		849	1.000	-151	-151	
877320	25204 Uummannaq, landingsbane	-6	0	-6	6	0	0	0	-6	-100 %
877320	25216 Tasiilaq, landingsbane		1.400	1.400	-13	1.387	1.400	-19	-13	-1 %
877320	25217 Ittoqqortoormiit, landingsbane		600	600	-13	587	600	-19	-13	-2 %
877322	25038 Radiofy, renovering	828		828	-828	0		0		-100 %
877322	25182 Udvidelse af terminalbygning, Kangerlussuaq	-753	2.118	1.365	-1.449	-84	27.075	-27.160	-27.160	-106 %
877322	25183 Langsigtede investeringsbehov	9.531	10.000	19.531	-10.361	9.170	50.000	-39.552	-49.694	-53 %
877322	25188 Ekstra renovering og istandsættelse 2014	-49	-18.100	-18.149	18.149	0	0	0	-18.149	-100 %
877322	25193 Vej til lufthavn i Qaanaaq	1.200		1.200		1.200	4.500	-3.300	-4.117	
877322	25206 Rullende materiel	-305	305	0		0	11.405	-11.405	-11.100	
877322	25207 Helikopterflyvepladser	-252		-252	354	102	5.000	-4.898	-5.251	-140 %
877322	25208 Vejrobservationstjeneste til lufthavne	1.893		1.893	-1.641	251	3.900	-3.576	-3.654	-87 %
877322	25212 Slidlagsbelægning, Qaarsut landingsbane	34		34		34	5.900	-5.866	-5.900	
877322	25213 Hangar til helikopter	2.021		2.021	-1.081	940	26.000	-25.060	-26.000	-53 %
877322	25214 Hangar til Tasiilaq	21.868		21.868	-17.998	3.870	29.300	-25.430	-29.300	-82 %
877322	25215 Coating af banen i Kangerlussuaq		6.800	6.800	-6.009	791	6.800	-5.934	-6.800	-88 %
877501	61003 Nyt skib til Pinngortitaleriffik	-2.240		-2.240		-2.240	220.000	-222.240	-222.256	
877503	74005 Tilskud til kommunale miljøanlæg	2.439		2.439		2.439	44.500	-42.061	-44.405	

877504	32148 Tilbygning til ASIAQ, Nuuk		1.700	1.700	-100	1.600	1.700	-701	-6 %	
897140	17777 Udlån til Nukissiorfiit, 2020	0	-60.000	-60.000	60.000	0	0	0	-100 %	
897140	17778 Udlån til Nukissiorfiit, 2021	0	-60.000	-60.000	60.000	0	0	0	-100 %	
897140	17779 Udlån til Nukissiorfiit, 2022		60.000	60.000	-60.000	0	60.000	-60.000	-100 %	
897212	30014 Alsidige boliger 2015, Qaqortoq	-151	150	-1		-1	27.950	-27.951	-27.951	
897212	30015 Alsidige boliger 2015, Maniitsoq	-739	738	-1		-1	47.338	-47.339	-47.363	
897212	30017 Bæredygtige boliger 2016, Sisimiut	4.046		4.046	-1.390	2.656	79.710	-77.067	-79.986	-34 %
897212	30019 Funktionelle boliger, Ilulissat	9.238	14.200	23.438	-16.630	6.808	62.200	-56.521	-59.349	-71 %
897212	30025 Nye boliger 2019, Qaqortoq	3.668	5.500	9.168	-6.528	2.640	28.800	-27.284	-28.443	-71 %
897212	30026 Nye boliger 2019, Aasiaat	17.982	16.800	34.782	-17.761	17.020	41.900	-28.021	-41.809	-51 %
897212	30028 Legeplads til skolen, Nuussuaq (UPV)	483		483		483	1.200	-717	-717	
897212	31029 Ekstra renovering og istandsættelse 2014	851	-850	1		1	39.150	-39.149	-39.149	
897212	31030 Diverse nedrivning Qaqortoq	4.874		4.874	-3.667	1.207	22.300	-21.093	-21.338	-75 %
897212	31031 Diverse nedrivning Narsaq	5.209		5.209	-68	5.141	16.000	-10.859	-10.980	-1 %
897212	31032 Diverse nedrivning Paamiut	12.952	1.000	13.952	-6.487	7.465	30.500	-23.035	-21.813	-46 %
897212	31033 Diverse nedrivning Nuuk	124		124	-59	64	12.300	-12.236	-12.274	-48 %
897212	31034 Diverse nedrivning Maniitsoq	3.347	1.000	4.347	-468	3.880	17.500	-13.620	-13.624	-11 %
897212	31035 Diverse nedrivning Sisimiut	3.303		3.303	-59	3.244	10.000	-6.756	-7.836	-2 %
897212	31036 Diverse nedrivning Aasiaat	3.577		3.577	-2.023	1.554	5.794	-4.240	-4.508	-57 %
897212	31037 Skimmel renovering	3.407	7.000	10.407	-5.243	5.165	60.700	-55.640	-56.819	-50 %
897212	31040 Diverse nedrivning Nanortalik	771		771		771	3.500	-2.729	-2.851	
897212	31041 Diverse nedrivning Ilulissat				-59	-59		-59	-59	
897212	31042 Diverse nedrivning Qasigiannuit	3.387		3.387	-74	3.313	7.000	-3.687	-3.748	-2 %
897212	31043 Landsdækkende skimmelrenovering	4.466	2.000	6.466	-1.264	5.202	33.000	-27.798	-29.758	-20 %
897212	31045 Diverse nedrivning Ilulissat	2.899	1.200	4.099	-59	4.039	4.100	-61	-62	-1 %
897212	31046 Renovering af boliger, Aasiaat	-177	176	-1		-1	12.882	-12.883	-12.883	
897212	31048 Renovering af altangange og altaner, Nuuk	1.888		1.888	-246	1.642	82.400	-80.835	-81.638	-13 %
897212	31049 Renovering af Centerbyggelsen, Qaqortoq	774		774	-642	131	11.100	-10.969	-10.819	-83 %
897212	31050 Renovering af altaner, Qaqortoq	6.193		6.193	-2.345	3.848	16.700	-12.852	-15.030	-38 %
897212	31051 Renovering af altaner, Paamiut	4.133		4.133	-962	3.172	11.400	-8.228	-10.089	-23 %
897212	31053 Renovering af altaner, Maniitsoq	4.460		4.460	-1.630	2.830	19.800	-16.970	-17.567	-37 %

897212	31055 Renovering af altaner, Sisimiut	6.348		6.348	-1.726	4.622	15.000	-10.378	-12.023	-27 %
897212	31058 Skimmel renovering, Qaqortoq	1.130	1.500	2.630	-1.869	760	5.500	-4.836	-5.497	-71 %
897212	31059 Skimmel renovering, Maniitsoq	4.000	1.500	5.500	-4.147	1.353	5.500	-4.147	-4.104	-75 %
897212	31060 Skimmel renovering, Sisimiut	7.985	2.000	9.985	-5.705	4.280	10.000	-9.000	-8.653	-57 %
897212	31062 Skimmel renovering, Aasiaat	0	1.500	1.500	-39	1.461	1.500	-39	-39	-3 %
897212	31063 Skimmel renovering, Ilulissat	3.500	1.500	5.000	-91	4.909	5.000	-91	-91	-2 %
897212	31064 Nedrivning af BSU-huse	7.284		7.284	-1.199	6.085	8.200	-2.332	-2.414	-16 %
897212	31065 Renovering af Eqalugalinnuguit, Nuuk	6.380		6.380	-7.836	-1.456	16.400	-17.850	-17.036	-123 %
897212	31066 Fornyelse af installationer i flere byer	36.782		36.782	-23.619	13.162	45.200	-33.345	-34.423	-64 %
897212	32124 Boliger	4.749	2.000	6.749	-389	6.360	31.540	-25.202	-28.159	-6 %
897212	32127 12 ældrevenlige boliger, Maniitsoq 2014	-366	365	-1		-1	8.265	-8.266	-8.266	
897212	32128 12 ældrevenlige boliger, Sisimiut 2014	-678	677	-1		-1	8.577	-8.578	-8.578	
897212	32129 Inissiat 30-it 2014, Tasiilaq	12.033		12.033		12.033	26.700	-14.667	-26.712	
897212	32133 24 boliger, Ilulissat 2014	17.923		17.923	-10	17.913	18.000	-87	-122	0 %
897212	32134 4 multifunktionshuse i bygder i Qaasuitsup Kommuni	-163	163	0		0	20.729	-20.729	-20.729	
897212	32140 Ungdomsboliger - typehus	656		656	-371	285	2.300	-2.218	-2.343	-57 %
897212	32141 Ungdomsboliger 2021, Qaanaaq	11.208		11.208	-9.382	1.825	16.100	-14.320	-15.399	-84 %
897212	32142 Ungdomsboliger, Tasiilaq		1.333	1.333	-756	577	1.333	-761	-851	-57 %
897212	32143 Ungdomsboliger, Upernavik		1.333	1.333	-718	615	1.333	-724	-784	-54 %
897212	32144 Ungdomsboliger, Qasigiannuguit		1.333	1.333	-633	700	1.333	-638	-725	-47 %
897212	32145 Ungdomsboliger, Uummannaq		1.333	1.333	-494	839	1.333	-589	-805	-37 %
897212	32146 Ungdomsboliger, Kangaatsiaq		1.334	1.334	-649	685	1.334	-651	-820	-49 %
897212	32147 Ungdomsboliger, Ittoqqortoormiit		1.334	1.334	-470	864	1.334	-472	-700	-35 %
897212	34527 Diverse renovering og sanering	85.271	74.300	159.571	-27.674	131.897	388.355	-263.870	-304.089	-17 %
897212	34534 Bæredygtige boliger 2017, Nuuk	-100		-100	100	0		0	-100	-100 %
897212	36101 Bygder- og yderdistrikter	-9	-15.000	-15.009	15.009	0	0	0	-15.009	-100 %
897212	38017 Udvikling af Illoq Nutaaq	-99	-700	-799	799	0	0	0	-799	-100 %
897212	38018 Forundersøgelser i Qaanaaq	-154	154	0		0	2.754	-2.754	-3.595	
897212	39041 Genhusning efter oversvømmelse	-28.814		-28.814	-614	-29.428	81.554	-110.946	-110.644	2 %
897212	39043 Opførelse af boliger, Qaarsut	13.735		13.735	-12.433	1.302	23.100	-21.830	-22.893	-91 %
<b>Total</b>		<b>1.028.540</b>	<b>240.386</b>	<b>1.268.926</b>	<b>-329.141</b>	<b>939.785</b>	<b>4.887.649</b>	<b>-4.005.561</b>	<b>-4.542.499</b>	<b>-26 %</b>

## Bilag 2: Projektstatus

Projektstadi	Projekt id & Navn	Finans- lov	Primo	Bevilling	Disponibel	Forbrug	Ultimo	Total bevilling Ultimo	Total forbrug	Total disponeret
Til intern revision	10019 Udvidelse af Landstingsaal	011014	-75		-75		-75	3.379		-3.455
Til intern revision	10053 Ny bygning til Inatsisatut	011014	1.488		1.488		1.488	3.000		-1.878
Igangværende	10049 22 mindre boliger til Inatsisartut	011015	1.936		1.936		1.936	6.000		-4.296
Igangværende	80800 Omrokeringsreserve	800001	9.800	54.827	64.627		64.627	64.627		
Igangværende	80801 Tilbageførsler fra Anlægs- og renoveringsfonden	800010	2.513		2.513		2.513	0		
Igangværende	10054 Selvstyrets Central Administration	811002	1.300		1.300		1.300	1.300		
Igangværende	90022 Pisariillisaaneq-projektet, ERP	822002	-3.850		-3.850	9.372	5.522	75.942	-9.372	-55.812
Igangværende	90028 Udvikling af ERP	822002	1.000	2.000	3.000		3.000	3.000		
Igangværende	40089 Fælles kommunalt ESDH-system til socialområdet	822003	11.000		11.000	-11.722	-722	11.000	11.722	-12.041
Igangværende	90024 Administrative systemer mv. i Skattestyrelse	822401	3.313	3.000	6.313	-3.380	2.933	8.400	3.380	-13.597
Igangværende	90025 Beskæftigelsesfradrag	822401	-1.384	6.300	4.916		4.916	6.300		-1.384
Igangværende	44044 Renovering og tilbygn. alderdomshjem, Nanortalik	833012	1.742		1.742		1.742	13.575		-13.581
Igangværende	44047 Alderdomshjem i Paamiut	833012	2.231		2.231		2.231	27.500		-27.506
Igangværende	44048 Pulje til nyanlæg og renovering	833012	7.700	13.800	21.500		21.500	21.500		
Lukket	44049 Tilstandsregistrering af ældreområdet	833012	-62	-3.600	-3.662	3.662	0	0	-3.662	-3.662
Igangværende	44051 Renovering/nybygning alderdomshjem, Narsaq	833012	6.520		6.520	-3.623	2.897	16.350	3.623	-23.663
Igangværende	44053 Udvidelse af alderdomshjem, Upernavik	833012	13.204		13.204	-3.679	9.525	18.000	3.679	-18.028
Igangværende	44054 Udvidelse af alderdomshjem, Aasiaat	833012	3.867		3.867		3.867	16.400		-16.406
Igangværende	44056 Demensafsnit på aldersomshjem, Sisimiut	833012	-460		-460		-460			-460
Igangværende	44057 Alderdomshjem, Ilulissat	833012		2.000	2.000		2.000	2.000		-2.000
Til intern revision	40054 Landsdækkende handicap træningscenter	833013	1.236	-1.236	0		0	55.033		-58.138
Til intern revision	40058 Handicapinstitution Elisibannguaq, Maniitsoq	833013	141	-141	0		0	7.459		-7.412
Til intern revision	40062 Udredningshjem	833013	6.129	-6.129	0		0	8.271		-8.789
Lukket	40063 Misbrugsbehandlingshjem	833013	2	-20	-18	18	0	0	-18	-18
Til intern revision	40064 Hus til ungdomsafdeling i Inn. Inaat	833013	-62		-62		-62	3.300		-3.392
Igangværende	40066 Opdeling af Aaqa i to institutioner	833013	1.979		1.979	-823	1.156	2.000	823	-2.511
Igangværende	40067 Pulje til nyanlæg og renovering	833013	22.467		22.467	-38	22.429	22.520	38	-91
Til intern revision	40068 Oprettelse af familie/krisecenter, Tasiilaq	833013	276	-276	0		0	2.224		-2.225
Til intern revision	40075 Lukket gårdmiljø til Isikkivik	833013	818	-818	0		0	12		-822

Igangværende	40077 Handicapinstitution Sungiusarfik Ikinngut	833013	12.536		12.536	-4.151	8.385	65.020	4.151	-60.255
Lukket	40081 Satellitafdeling til Meeqqat Illuat, Nuuk	833013	-11	-40	-51	51	0	0	-51	-51
Til intern revision	40084 Genopførelse af udslusninghjem, Uummanaq	833013	5.035	280	5.315	-5.315	0	5.595	5.315	-6.358
Igangværende	40086 Døgninstitution for børn med sindslidelser	833013	5.431		5.431	-178	5.253	6.000	178	-838
Igangværende	40090 Etablering af satellitafdeling til Pilutaq	833013	1.691		1.691	-1.442	249	7.000	1.442	-6.907
Igangværende	40091 Najugaqarfik Elisibannuaq-nybyg og renovering	833013	30.891		30.891	-6.563	24.328	34.500	6.563	-28.681
Igangværende	40092 Aktivitetshus til børn og unge, Kullorsuaq	833013		9.000	9.000		9.000	9.000		
Igangværende	40093 Forsøgsordning for hjemløse i Nuuk	833014		3.900	3.900		3.900	3.900		
Til intern revision	51013 Udvidelse INUILL, Narsaq	844009	-209	208	-1		-1	61.608		-61.609
Til intern revision	50069 Ren/ombygning udv. skole Qaqortoq	844010	936	-935	1		1	114.765		-114.764
Lukket	50091 Skolen Aappilattoq	844010	64	-18.150	-18.086	18.086	0	0	-18.086	-17.637
Til intern revision	50111 Ren./ombygning udv. skole, Sarfannguit	844010	514	-514	0		0	8.986		-9.517
Til intern revision	50115 Ren./ombygning udv. skole, Nuussuaq	844010	772	-771	1		1	9.029		-9.031
Til intern revision	50126 Udv./ren./ombygning af skole, Upv. Kujalleq	844010	2.631		2.631		2.631	13.700		-11.333
Til intern revision	50131 Ny skole i Ilulissat	844010	201	-201	0		0	192.454		-195.481
Til intern revision	50132 Diverse skole, nyanlæg og renovering	844010	-7.254		-7.254		-7.254	-1.050		-6.179
Til intern revision	50133 Bygdeskole, Alluitsup Paa	844010	-1.510		-1.510		-1.510	27.850		-29.818
Til intern revision	51021 Projektplan for udflytning af udd. inst.	844012	-330	329	-1		-1	2.829		-3.076
Igangværende	51024 Uddannelsesbyggeri til projektering af ny Jern- og Metalskol	844012	9.431		9.431		9.431	10.000		-953
Igangværende	51026 Landbrugsskole i Upernaviarsuk	844012	2.873		2.873	-131	2.743	3.000	131	-544
Til intern revision	52061 Udvidelse af GU, Aasiaat	844012	-182	182	0		0	89.582		-89.582
Lukket	52085 Renov. af udd. bygninger Qeq. kommunia	844012	-62	-309	-371	371	0	0	-371	-330
Til intern revision	52086 Udvidelse af PISPS, Ilulissat	844012	-814	813	-1		-1	45.157		-45.156
Til intern revision	52087 Erstatningsbyggeri for NI+GU, Qaqortoq	844012	471	-471	0		0	103.929		-104.680
Til intern revision	52088 Erstatningsbyggeri for Ledelsesakademi, Nuuk	844012	-550	549	-1		-1	13.049		-13.050
Igangværende	52094 Renovering af Knud Rasmussenip Højskolia	844012	-2.958		-2.958	-291	-3.249	19.691	291	-22.871
Igangværende	52095 Skolepraktikhaller og haller til ko	844012	948		948	-220	727	36.500	220	-36.389
Igangværende	52118 Diverse renovering	844012		31.200	31.200	-30.190	1.010	31.200	30.190	-13.917
Igangværende	52119 Tilstandsregistrering af uddannelsesbygninger	844012		8.000	8.000	-177	7.823	8.000	177	-177
Igangværende	54007 Tilskud til renovering af idrætshaller	844014	5.596	3.500	9.096	-917	8.178	21.400	917	-13.942
Til intern revision	52071 Skolehjem med 50 værelser, Uummanaq	844015	-472	472	0		0	32.472		-32.587

Igangværende	52092 Etablering/renovering elevhjem Qassarsuk	844015	5.245		5.245	-197	5.048	20.700	197	-19.933
Til intern revision	52101 Projektering af standardkollegier, 2015	844015	-304	304	0		0	2.382		-2.382
Igangværende	52102 Projektering af standardkollegier	844015	3.118	4.100	7.218	-4.819	2.399	10.100	4.819	-29.059
Lukket	52103 Projektering af standardkollegier, 2017	844015	13	-2.100	-2.087	2.087	0	0	-2.087	-2.127
Til intern revision	52104 Diverse kollegieprojekter	844015	-10.560		-10.560	10.560	0	0	-10.560	-10.560
Igangværende	52111 32 sengepladser, Aasiaat	844015	31.399	8.000	39.399	-17.216	22.183	49.800	17.216	-44.193
Igangværende	52112 70 sengepladser, Ilulissat	844015	35.254	9.000	44.254	-22.587	21.667	53.600	22.587	-46.688
Igangværende	52113 72 sengepladser, Sisimiut	844015	49.622	10.100	59.722	-23.111	36.610	74.350	23.111	-50.263
Igangværende	52114 219 sengepladser, Nuuk	844015	91.340	15.000	106.340	-95.128	11.212	146.500	95.128	-141.163
Igangværende	52115 74 sengepladser, Qaqortoq	844015	11.525	13.000	24.525	-15.015	9.509	64.850	15.015	-66.668
Til intern revision	56003 Ny KNR	844016	-250	250	0		0	12.370		-12.402
Lukket	41050 Daginstitution i Atammik, 2015	844017	9	-2.400	-2.391	2.391	0	0	-2.391	-2.400
Lukket	50148 Køb af hus til Ado Lyngep Atuarfia	844018	47	-475	-428	428	0	0	-428	-432
Til intern revision	58041 Renovering af kirke, Ittoqqortoormiit	844501	476	-476	0		0	979		-1.069
Til intern revision	58046 Genopførelse, Kirken i Nuussuaq	844501	-373	373	0		0	373		-373
Lukket	72003 Is-fjordscenteret, Ilulissat	855020	0	-15.000	-15.000	15.000	0	0	-15.000	-15.000
Igangværende	72004 Etablering af Visitorcentre	855020	10.300		10.300	-402	9.898	10.300	402	-1.183
Igangværende	72010 Nuuk Natur- og geopark	855020	9.750		9.750		9.750	9.750		
Igangværende	72011 Nationale seværdigheder	855020	-4.650		-4.650		-4.650	-4.650		
Igangværende	61004 Anskaffelse af Fartøjer til GFLK	859001		6.500	6.500	637	7.137	6.500	-637	-2.589
Lukket	46009 Laboratorium/DIH, Nuuk	866001	18		18	-18	0		18	
Lukket	46017 Patienthotel, Nuuk	866001	-25	-66.522	-66.547	66.547	0	0	-66.547	-66.547
Igangværende	46021 Psykiatribygning i Nuuk	866001	936	1.100	2.036	-1.184	852	24.100	1.184	-24.533
Igangværende	46023 Energioptimering DIH, Nuuk	866001	1.076		1.076	-36	1.039	7.000	36	-5.961
Lukket	46026 Allorfik, lokale misbrugsbehandlingscenter	866001	44	-1.900	-1.856	1.856	0	0	-1.856	-1.856
Til intern revision	46027 Allorfik, misbrugsbehandlingscenter, Sisimiut	866001	221	-221	0		0	2.279		-2.279
Til intern revision	46028 Patienthotel i Aasiaat	866001	-1.046	1.045	-1		-1	17.956		-17.640
Lukket	46029 Allorfik, misbrugsbehandlingscenter, Aasiaat	866001	55	-2.500	-2.445	2.445	0	0	-2.445	-2.701
Til intern revision	46030 Allorfik, misbrugsbehandlingscenter, Ilulissat	866001	983	-982	1		1	2.018		-2.017
Igangværende	46031 Projektering af ny sengefløj og patienthotel	866001	2.944	5.000	7.944	-1.897	6.048	8.000	1.897	-2.604
Igangværende	46032 Rømning af byggegrund	866001	3.000		3.000		3.000	3.000		

Igangværende	46033 Steno Diabetes Center	866001	3.003		3.003	-13.583	-10.580		13.583	-38.083
Igangværende	46034 Anskaffelser af ambulancer	866001	4.552	2.500	7.052	-3.457	3.595	7.500	3.457	-3.905
Igangværende	46035 Allorfik, misbrugsbehandlingscenter Nuuk	866001		6.000	6.000	-5.786	215	6.000	5.786	-5.786
Igangværende	46037 Tilskud til Neriuffik	866001		1.500	1.500		1.500	1.500		
Til intern revision	47031 Udbygning DIH - fondsmidler	866001	-136		-136		-136	53.428		-193.660
Igangværende	47041 Ilt produktions anlæg i sygehuse	866001	2.827		2.827		2.827	6.500		-3.673
Igangværende	47042 Regionssygehus i Sisimiut	866001	2.393	111.400	113.793	-28.835	84.957	113.800	28.835	-43.783
Til intern revision	47047 Børneafdeling på DIH, Nuuk	866001	300	-300	0		0	200		-203
Igangværende	47051 Apparaturløjen	866001	25.696	17.900	43.596	-11.208	32.388	121.000	11.208	-88.635
Igangværende	47053 Vedligeholdelseefterslæb	866001	13.599	28.400	41.999	-25.827	16.172	135.400	25.827	-119.228
Igangværende	47055 Diverse nyanlæg og renovering	866001	133.904	-108.800	25.104		25.104	25.250		-149
Lukket	47060 Nyt operationsafsnit, Sisimiut	866001	-2.620	-2.550	-5.170	5.170	0	0	-5.170	0
Igangværende	48013 Centralklinik i Nuuk	866001	7.011		7.011	-585	6.426	9.218	585	-3.993
Til intern revision	29107 Vej i Sydgrønland	870088	1.821	-1.821	0		0	28.004		-28.093
Igangværende	29108 Vej mellem Sisimit og Kangerlussuaq	870088	4.498		4.498		4.498	5.000		-502
Til intern revision	73014 5-års eftersyn, 2019	871106	303	-303	0		0	197		-372
Til intern revision	73015 5-års eftersyn, 2020	871106	206	-205	1		1	295		-314
Igangværende	73016 5-års eftersyn	871106	299	500	799	-135	664	1.000	135	-443
Igangværende	23004 Transportkommissionen - forundersøgelser	871109	30.906	-11.418	19.488	-3.497	15.992	65.735	3.497	-51.843
Igangværende	30012 Personaleboliger i Nuuk	877210	13.131	3.500	16.631	-838	15.793	25.500	838	-12.153
Igangværende	97157 Bevaringsværdige bygninger i Nuuk	877213	80	7.000	7.080	-311	6.769	18.000	311	-11.844
Lukket	32066 Støttet kom. udl.byggeri, 2006	877221	0	-21.366	-21.366	21.366	0	0	-21.366	-21.366
Til intern revision	32090 Støttet kom. udl.byggeri, 2009	877221	-1.556	1.556	0		0	71.356		-71.356
Til intern revision	35025 Boligprg.f/bygder og yderd. 2015	877222	-708	708	0		0	9.108		-9.108
Til intern revision	35026 Boligprg.f/bygder og yderd. 2016	877222	0	18	18	-6.254	-6.236	18	6.254	-6.273
Til intern revision	36106 Udvikling og afprøvning af Illorput 2100	877222	-153	153	0		0	2.633		-2.633
Igangværende	39039 Aktivitetshus til Kullorsuaq	877222	3.500		3.500		3.500	3.500		-3.500
Til intern revision	24111 Ekstra renovering og istandsættelse 2014	877310	2.737	-2.736	1		1	5.964		-8.708
Til intern revision	24112 Sektorplan for havne, 2015	877310	2.043	-2.043	0		0	457		-2.429
Igangværende	24116 Reinvestering i havne og kaj anlæg	877312	18.000	25.200	43.200	-19.404	23.796	195.069	19.404	-180.920
Igangværende	24122 Sektorplaner for havne	877312	3.600		3.600		3.600	3.700		-104



Igangværende	24128 Diverse nyanlæg	877312	21.318	19.400	40.718	40.718	40.922		-236	
Igangværende	24129 Havn i Kangerlussuaq	877312	3.633		3.633	3.633	4.000		-459	
Til intern revision	24130 Læmole i Qaanaaq	877312	-935	935	0	0	33.935		-33.813	
Igangværende	24131 Havnefaciliteter i Uummannaq	877312	4.443		4.443	-111	4.332	34.100	111	-32.222
Igangværende	24136 Etablering af anløbsfaciliteter	877312	3.145		3.145	-1.350	1.795	4.150	1.350	-2.355
Igangværende	24138 Havnefaciliteter i Aasiaat	877312		2.500	2.500		2.500	2.500		
Igangværende	24139 Havnefaciliteter i Maniitsoq	877312		3.000	3.000		3.000	3.000		
Igangværende	24140 Havnefaciliteter i Kullorsuaq	877312		600	600		600	600		
Til intern revision	25196 Qeqertarsuaq	877320	483	-483	0	0	17		-10	
Lukket	25200 Nanortalik	877320	-15	0	-15	15	0	0	-15	-9
Igangværende	25201 Kangerlussuaq	877320	849		849		849	1.000		-151
Lukket	25204 Uummannaq, landingsbane	877320	-6	0	-6	6	0	0	-6	-6
Igangværende	25216 Tasiilaq, landingsbane	877320		1.400	1.400	-13	1.387	1.400	13	-13
Igangværende	25217 Ittoqqortoormiit, landingsbane	877320		600	600	-13	587	600	13	-13
Lukket	25038 Radiofyrr, renovering	877322	828		828	-828	0		828	
Til intern revision	25182 Udvidelse af terminalbygning, Kangerlussuaq	877322	-753	2.118	1.365	-1.449	-84	27.075	1.449	-27.160
Igangværende	25183 Langsigtede investeringsbehov	877322	9.531	10.000	19.531	-10.361	9.170	50.000	10.361	-49.694
Lukket	25188 Ekstra renovering og istandsættelse 2014	877322	-49	-18.100	-18.149	18.149	0	0	-18.149	-18.149
Igangværende	25193 Vej til lufthavn i Qaanaaq	877322	1.200		1.200		1.200	4.500		-4.117
Til intern revision	25206 Rullende materiel	877322	-305	305	0	0	11.405		-11.100	
Til intern revision	25207 Helikopterflyvepladser	877322	-252		-252	354	102	5.000	-354	-5.251
Igangværende	25208 Vejrobservationstjeneste til lufthavne	877322	1.893		1.893	-1.641	251	3.900	1.641	-3.654
Igangværende	25212 Slidlagsbelægning, Qaarsut landingsbane	877322	34		34		34	5.900		-5.900
Igangværende	25213 Hangar til helikopter	877322	2.021		2.021	-1.081	940	26.000	1.081	-26.000
Igangværende	25214 Hangar til Tasiilaq	877322	21.868		21.868	-17.998	3.870	29.300	17.998	-29.300
Igangværende	25215 Coating af banen i Kangerlussuaq	877322		6.800	6.800	-6.009	791	6.800	6.009	-6.800
Igangværende	61003 Nyt skib til Pinngortitaleriffik	877501	-2.240		-2.240		-2.240	220.000		-222.256
Til intern revision	74005 Tilskud til kommunale miljøanlæg	877503	2.439		2.439		2.439	44.500		-44.405
Igangværende	32148 Tilbygning til ASIAQ, Nuuk	877504		1.700	1.700	-100	1.600	1.700	100	
Lukket	17777 Udlån til Nukissiofiit, 2020	897140	0	-60.000	-60.000	60.000	0	0	-60.000	
Lukket	17778 Udlån til Nukissiofiit, 2021	897140	0	-60.000	-60.000	60.000	0	0	-60.000	

Igangværende	17779 Udlån til Nukissioffiit, 2022	897140		60.000	60.000	-60.000	0	60.000	60.000	
Til intern revision	30014 Alsidge boliger 2015, Qaqortoq	897212	-151	150	-1		-1	27.950		-27.951
Til intern revision	30015 Alsidge boliger 2015, Maniitsoq	897212	-739	738	-1		-1	47.338		-47.363
Igangværende	30017 Bæredygtige boliger 2016, Sisimiut	897212	4.046		4.046	-1.390	2.656	79.710	1.390	-79.986
Igangværende	30019 Funktionelle boliger, Ilulissat	897212	9.238	14.200	23.438	-16.630	6.808	62.200	16.630	-59.349
Igangværende	30025 Nye boliger 2019, Qaqortoq	897212	3.668	5.500	9.168	-6.528	2.640	28.800	6.528	-28.443
Igangværende	30026 Nye boliger 2019, Aasiaat	897212	17.982	16.800	34.782	-17.761	17.020	41.900	17.761	-41.809
Igangværende	30028 Legeplads til skolen, Nuussuaq (UPV)	897212	483		483		483	1.200		-717
Til intern revision	31029 Ekstra renovering og istandsættelse 2014	897212	851	-850	1		1	39.150		-39.149
Igangværende	31030 Diverse nedrivning Qaqortoq	897212	4.874		4.874	-3.667	1.207	22.300	3.667	-21.338
Igangværende	31031 Diverse nedrivning Narsaq	897212	5.209		5.209	-68	5.141	16.000	68	-10.980
Igangværende	31032 Diverse nedrivning Paamiut	897212	12.952	1.000	13.952	-6.487	7.465	30.500	6.487	-21.813
Igangværende	31033 Diverse nedrivning Nuuk	897212	124		124	-59	64	12.300	59	-12.274
Igangværende	31034 Diverse nedrivning Maniitsoq	897212	3.347	1.000	4.347	-468	3.880	17.500	468	-13.624
Igangværende	31035 Diverse nedrivning Sisimiut	897212	3.303		3.303	-59	3.244	10.000	59	-7.836
Igangværende	31036 Diverse nedrivning Aasiaat	897212	3.577		3.577	-2.023	1.554	5.794	2.023	-4.508
Igangværende	31037 Skimmel renovering	897212	3.407	7.000	10.407	-5.243	5.165	60.700	5.243	-56.819
Igangværende	31040 Diverse nedrivning Nanortalik	897212	771		771		771	3.500		-2.851
Igangværende	31041 Diverse nedrivning Ilulissat	897212				-59	-59		59	-59
Igangværende	31042 Diverse nedrivning Qasigiannugit	897212	3.387		3.387	-74	3.313	7.000	74	-3.748
Igangværende	31043 Landsdækkende skimmelrenovering	897212	4.466	2.000	6.466	-1.264	5.202	33.000	1.264	-29.758
Igangværende	31045 Diverse nedrivning Ilulissat	897212	2.899	1.200	4.099	-59	4.039	4.100	59	-62
Til intern revision	31046 Renovering af boliger, Aasiaat	897212	-177	176	-1		-1	12.882		-12.883
Igangværende	31048 Renovering af altangange og altaner, Nuuk	897212	1.888		1.888	-246	1.642	82.400	246	-81.638
Igangværende	31049 Renovering af Centerbebyggelsen. Qaqortoq	897212	774		774	-642	131	11.100	642	-10.819
Igangværende	31050 Renovering af altaner, Qaqortoq	897212	6.193		6.193	-2.345	3.848	16.700	2.345	-15.030
Igangværende	31051 Renovering af altaner, Paamiut	897212	4.133		4.133	-962	3.172	11.400	962	-10.089
Igangværende	31053 Renovering af altaner, Maniitsoq	897212	4.460		4.460	-1.630	2.830	19.800	1.630	-17.567
Igangværende	31055 Renovering af altaner, Sisimiut	897212	6.348		6.348	-1.726	4.622	15.000	1.726	-12.023
Igangværende	31058 Skimmel renovering, Qaqortoq	897212	1.130	1.500	2.630	-1.869	760	5.500	1.869	-5.497
Igangværende	31059 Skimmel renovering, Maniitsoq	897212	4.000	1.500	5.500	-4.147	1.353	5.500	4.147	-4.104

Igangværende	31060 Skimmel renovering, Sisimiut	897212	7.985	2.000	9.985	-5.705	4.280	10.000	5.705	-8.653
Igangværende	31062 Skimmel renovering, Aasiaat	897212	0	1.500	1.500	-39	1.461	1.500	39	-39
Igangværende	31063 Skimmel renovering, Ilulissat	897212	3.500	1.500	5.000	-91	4.909	5.000	91	-91
Igangværende	31064 Nedrivning af BSU-huse	897212	7.284		7.284	-1.199	6.085	8.200	1.199	-2.414
Igangværende	31065 Renovering af Eqalugalinnguit, Nuuk	897212	6.380		6.380	-7.836	-1.456	16.400	7.836	-17.036
Igangværende	31066 Fornylse af installationer i flere byer	897212	36.782		36.782	-23.619	13.162	45.200	23.619	-34.423
Igangværende	32124 Boliger	897212	4.749	2.000	6.749	-389	6.360	31.540	389	-28.159
Til intern revision	32127 12 ældrevenlige boliger, Maniitsoq 2014	897212	-366	365	-1		-1	8.265		-8.266
Til intern revision	32128 12 ældrevenlige boliger, Sisimiut 2014	897212	-678	677	-1		-1	8.577		-8.578
Igangværende	32129 Inissiat 30-it 2014, Tasiilaq	897212	12.033		12.033		12.033	26.700		-26.712
Igangværende	32133 24 boliger, Ilulissat 2014	897212	17.923		17.923	-10	17.913	18.000	10	-122
Til intern revision	32134 4 multifunktionshuse i bygder i Qaasuitsup Kommuni	897212	-163	163	0		0	20.729		-20.729
Igangværende	32140 Ungdomsboliger - typehus	897212	656		656	-371	285	2.300	371	-2.343
Igangværende	32141 Ungdomsboliger 2021, Qaanaaq	897212	11.208		11.208	-9.382	1.825	16.100	9.382	-15.399
Igangværende	32142 Ungdomsboliger, Tasiilaq	897212		1.333	1.333	-756	577	1.333	756	-851
Igangværende	32143 Ungdomsboliger, Upernavik	897212		1.333	1.333	-718	615	1.333	718	-784
Igangværende	32144 Ungdomsboliger, Qasigiannnguit	897212		1.333	1.333	-633	700	1.333	633	-725
Igangværende	32145 Ungdomsboliger, Uummannaq	897212		1.333	1.333	-494	839	1.333	494	-805
Igangværende	32146 Ungdomsboliger, Kangaatsiaq	897212		1.334	1.334	-649	685	1.334	649	-820
Igangværende	32147 Ungdomsboliger, Iltoqqortoormiit	897212		1.334	1.334	-470	864	1.334	470	-700
Igangværende	34527 Diverse renovering og sanering	897212	85.271	74.300	159.571	-27.674	131.897	388.355	27.674	-304.089
Lukket	34534 Bæredygtige boliger 2017, Nuuk	897212	-100		-100	100	0		-100	-100
Lukket	36101 Bygder- og yderdistrikter	897212	-9	-15.000	-15.009	15.009	0	0	-15.009	-15.009
Lukket	38017 Udvikling af Illoq Nutaaq	897212	-99	-700	-799	799	0	0	-799	-799
Til intern revision	38018 Forundersøgelser i Qaanaaq	897212	-154	154	0		0	2.754		-3.595
Igangværende	39041 Genhusning efter oversvømmelse	897212	-28.814		-28.814	-614	-29.428	81.554	614	-110.644
Igangværende	39043 Opførelse af boliger, Qaarsut	897212	13.735		13.735	-12.433	1.302	23.100	12.433	-22.893
<b>Total</b>			<b>1.028.540</b>	<b>240.386</b>	<b>1.268.926</b>	<b>-329.141</b>	<b>939.785</b>	<b>4.887.649</b>	<b>329.141</b>	<b>-4.542.498</b>

## Inatsisartutlov nr. 26 af 28. november 2016 om kommunernes og Grønlands Selvstyres budgetter og regnskaber med senere ændringer

### Kapitel 4

*Finanslov, årsbudget m.v.*

*Anlæg, renovering m.v.*

**§ 14.** Anlægs- og renoveringsfonden er en budget- og regnskabsteknisk fond, som indgår i landskassen.

*Stk. 2.* I Anlægs- og renoveringsfonden indtægtsføres finanslovens anlægsbevillinger. Dette gælder også anlægsbevillinger, som senere er godkendt af Inatsisartuts finansudvalg, og bevillinger, som måtte være afsat i medfør af § 13, stk. 4.

*Stk. 3.* Anlægsprojekternes udgifter udgiftsføres i Anlægs- og renoveringsfonden.

*Stk. 4.* Betalingsforskydninger mellem finansårene udlignes i Anlægs- og renoveringsfonden.

*Stk. 5.* Mindreudgifter på det enkelte anlægsprojekts bevilgede totaludgift tilbageføres til Landskassen, når projektet er afsluttet.

**§ 15.** Den Naalakkersuisoq, som efter formanden for Naalakkersuisuts nærmere bestemmelse er bemyndiget hertil, fastsætter budget- og bevillingsmæssige bestemmelser for Anlægs- og renoveringsfondens virksomhed.

**§ 16.** Den Naalakkersuisoq, som efter formanden for Naalakkersuisuts nærmere bestemmelse er bemyndiget hertil, forestår den løbende administration af Anlægs- og renoveringsfonden.

**§ 17.** Naalakkersuisut udarbejder en årlig redegørelse til Inatsisartut om Anlægs- og renoveringsfondens aktivitet, herunder en separat status for henholdsvis nye projekter, igangværende projekter og afsluttede eller aflyste projekter.

*Stk. 2.* Redegørelsen opdeles på projektyper og projektgrupper og således, at der skelnes mellem bevillinger afsat til nyanskaffelse og bevillinger til vedligeholdelse og renovering.
